
DIAGRAMA GANTT CU ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Contractul de finantare 3904/11.03.2019**, Codul SMIS:** 118792

Titlul proiectului: Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi

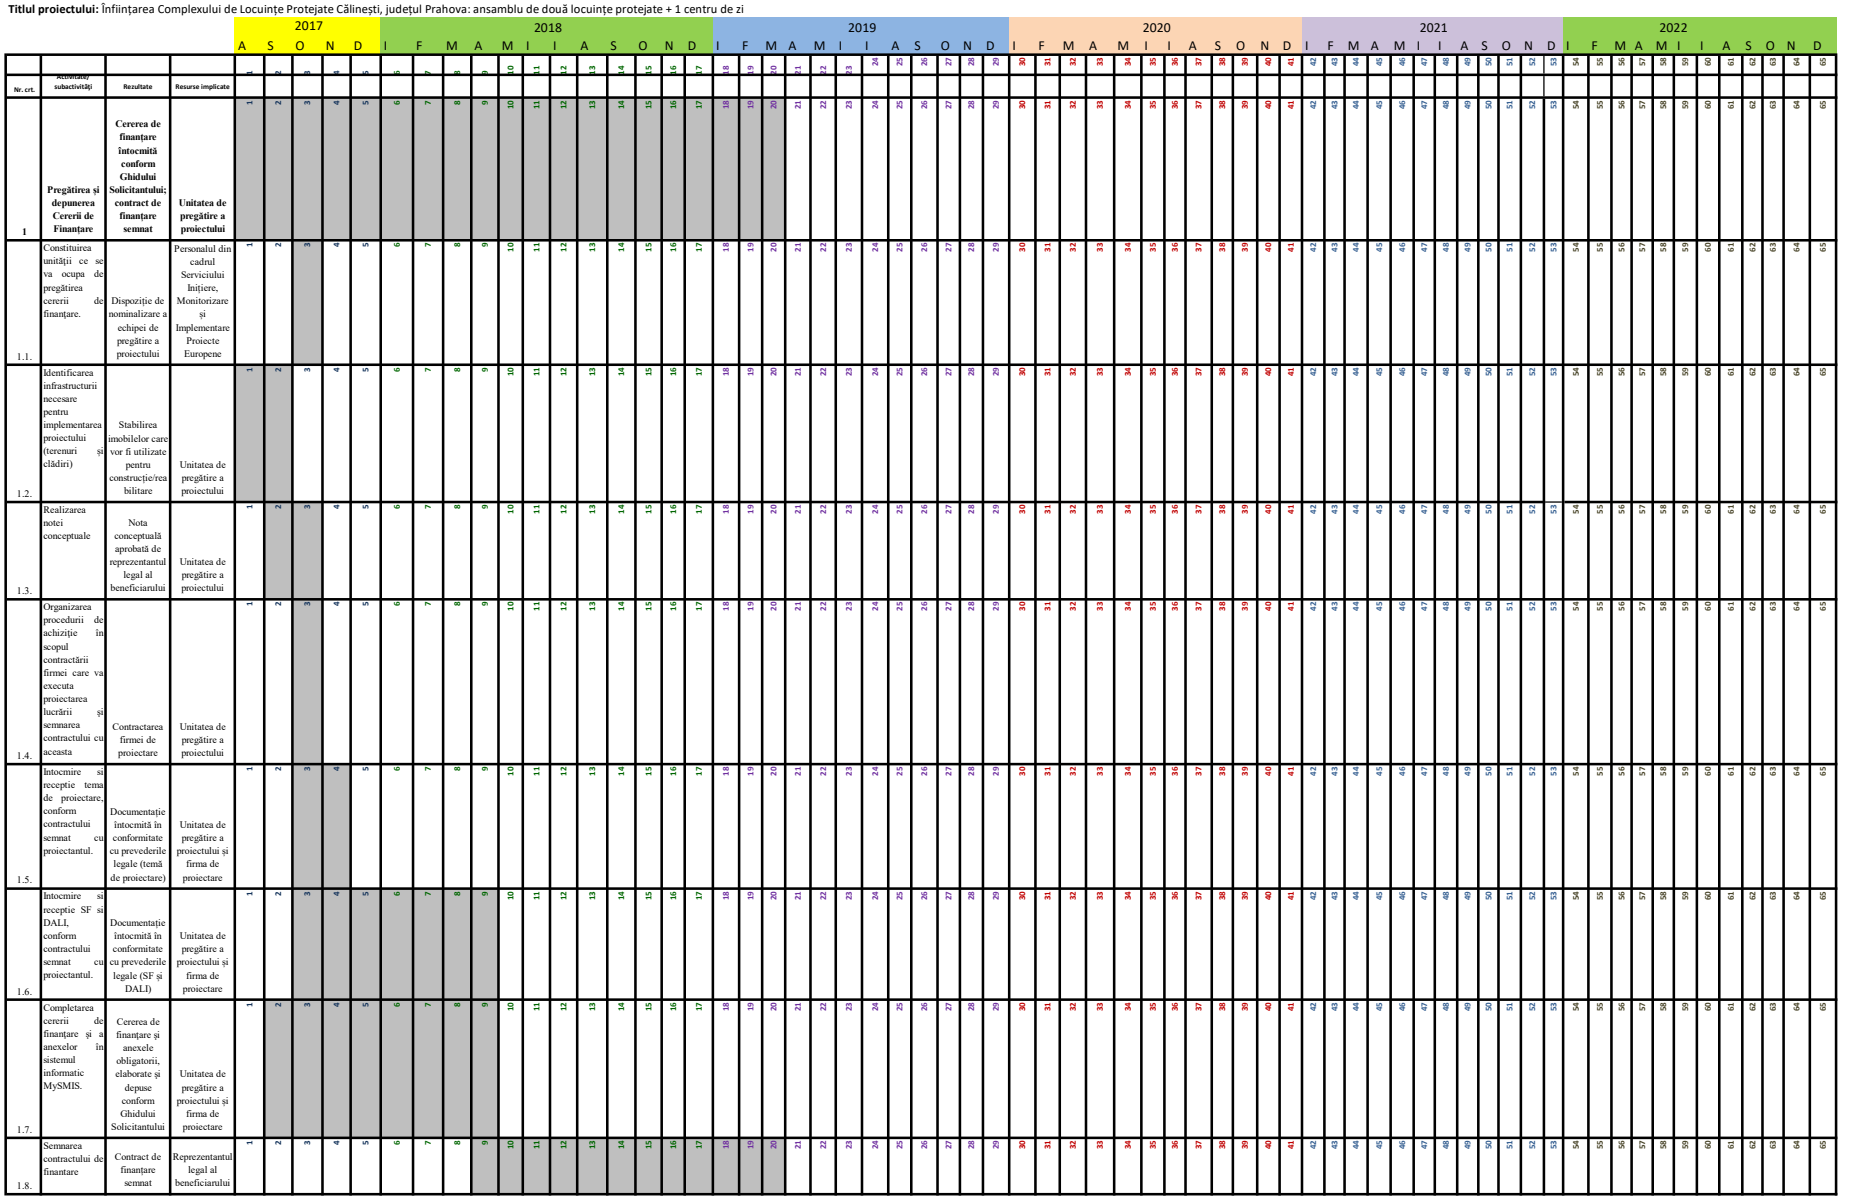

2	2.1.	2.2.	3	3.1.	3.2.	4	4.1.	4.2.
Executie si verificare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)	Executie si receptie Proiect Tehnic (PT), Documentatie Tehnică Autorizare Construcții (DTAC), Caiet de Sarcini (CS), Detalii Execuție (DE)	Obtinerea autorizatiei de construire (AC)	**Contractarea firmei de consultanță**	Organizarea procedurii de achiziție publică pentru contractarea consultantului de management și a consultantului financiar. semnarea contractului	Asigurarea consultanței specifice în management proiectului și în domeniul financiar	**Management general al proiectului**	Constituirea unității de implementare a proiectului.	Stabilirea procedurilor de lucru în cadrul Unității de implementare a Proiectului (UIP)
Documentatie conformitate legale	**Intocmirea documentatiei conform legislatiei**	Eliberare autorizatie de construire	**Contract de furnizare servicii de consultanță încheiat**	Contract de furnizare servicii de consultanță încheiat	**Proiect implementat în conformitate cu contractul de finanțare încheiat**	**Proiect implementat în conformitate cu contractul de finanțare încheiat**	Dispozitie de nominalizare a echipei de pregătire a proiectului	Procedura de lucru asumată de membrii unității de implementare a proiectului
Unitatea de implementare a proiectului și firma de proiectare	Unitatea de implementare a proiectului și firma de proiectare	Unitatea de implementare a proiectului	**Unitatea de implementare a proiectului**	Unitatea de implementare a proiectului	Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar	**Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar**	Unitatea de implementare a proiectului	Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	56
56	56	56	56	56	56	56	56	57
57	57	57	57	57	57	57	57	58
58	58	58	58	58	58	58	58	59
59	59	59	59	59	59	59	59	60
60	60	60	60	60	60	60	60	61
61	61	61	61	61	61	61	61	62
62	62	62	62	62	62	62	62	63
63	63	63	63	63	63	63	63	64
64	64	64	64	64	64	64	64	65
65	65	65	65	65	65	65	65	65

4.3.	Monitorizarea și planificarea financiară, asigurarea plăților, întocmirea cererilor de rambursare/plata	Asigurarea fluxului de numerar	Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
4.4.	Monitorizarea și planificarea tehnică	Derularea activităților în conformitate cu graficul de activități	Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
4.5.	Desfășurarea activităților specifice de management	Derularea activităților în conformitate cu graficul de activități	Unitatea de implementare a proiectului și consultantul de management/ consultantul financiar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
5	**Asigurarea serviciilor de asistență tehnică**	**Lucrări executate în conformitate cu documentația specifică (PT, DTAC etc.)**	**Unitatea de implementare a proiectului**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
5.1.	Organizarea procedurii de achiziție publică pentru contractarea asistenței tehnice din partea proiectantului, semnarea contractului	Contract de furnizare servicii de asisență tehnică încheiat	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
5.2.	Asistența tehnică din partea proiectantului	Lucrări executate în conformitate cu documentația specifică (PT, DTAC etc.)	Unitatea de implementare a proiectului și firma de proiectare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
5.3.	Organizarea procedurii de achiziție publică pentru contractarea dirigintelui de șantier, semnarea contractului	Contract de furnizare servicii de dirigenție de șantier încheiat	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
5.4.	Dirigenția de șantier	Lucrări executate în conformitate cu documentația specifică (PT, DTAC etc.)	Unitatea de implementare a proiectului și dirigintele de șantier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
6	**Execuția lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare**	**Construcția a 2 locuințe protejate și reabilitarea unei clădiri pentru centrul de zi**	Unitatea de implementare a proiectului, dirigintele de șantier și firma de proiectare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

6.1.	Organizarea procedurii de achiziție publică pentru contractarea executantului lucrărilor.	Contractul pentru execuția lucrărilor încheiat	Unitatea de implementare a proiectului și firma de proiectare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
6.2.	Execuția lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare	Desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică	Unitatea de implementare a proiectului, firma de proiectare, executantul lucrării, dirigintele de șantier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
6.3.	Pregătirea personalului pentru a putea opera cu noile ehipamente și efectuarea probelor tehnologice	Dobândirea de noi cunoștințe și abilități de către personalul implicat	Unitatea de implementare a proiectului, executantul lucrări	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
6.4.	Recepţia lucrărilor de reabilitare, modernizare și dezvoltare	2 locuințe protejate construite; 1 clădire reabilitată pentru centrul de zi	Unitatea de implementare a proiectului, firma de proiectare, executantul lucrării, dirigintele de șantier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
7	**Dotarea locuințelor protejate și a centrului de zi**	**Bunuri achiziționate în conformitate cu prevedereile contractului de finanțare**	**Unitatea de implementare a proiectului**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
7.1.	Organizarea și derularea procedurii de achiziții publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor ocupa de dotările specifice	Contractul pentru achiziția de dotări încheiat	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
7.2.	Livrarea și recepţia dotărilor	Bunuri achiziționate numeric și calitativ conform contractului de finanțare	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
8	**Asigurare publicității și informării cu privire la proiect**	**Asigurarea vizibilității proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală**	**Unitatea de implementare a proiectului**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
8.1.	Organizarea și derularea procedurii de achiziții publice, pentru contractarea publicităţii proiectului	Contract pentru serviciile de publicitate și informare încheiat	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
8.2.	Asigurarea publicității și informării	2 comunicate presă elaborate, avizate și publicate; 2 panouri temporare montate; 2 plăci permanente montate.	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

8.3.	Asigurarea activităților de marketing și promovare	1 pagina web elaborată, avizată, funcțională	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
9	**Auditarea proiectului**	**Cheltuieli verificate și avizate de către auditor**	**Unitatea de implementare a proiectului**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
9.1.	Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru contractarea auditorilor externi, semnarea contractului	Contract de furnizare servicii de auditare încheiat	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
9.2.	Derularea activităților specifice și întocmirea rapoartelor de audit	Verificarea cheltuielilor și certificarea conformității lor cu contractul de finanțare	Unitatea de implementare a proiectului și firma de auditare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
10	**Comisioane, cote, taxe**	**Emiterea documentelor aferente cererii de finanțare sau implementării proiectului (avize etc.)**	**Unitatea de implementare a proiectului**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
10.1	Asigurarea plății pentru comisioanele, cotele și taxele prevăzute de legislația în vigoare	Comisioane, cote, taxe prevăzute de legislația în vigoare achitate	Unitatea de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
